Kontrollskjema Membra® Membransystem

MEMBRA®
ISOLA VÅTROMSYSTEM

Dato _____ **Gnr./Bnr.:** _____

Adresse: _____

Vegg ☐ **Gulv** ☐

Underlag vegg: _____ **Underlag gulv:** _____

Er det fall på sluk på 1:100? _____ **Er det lokalt fall på 1:50 i området rundt sluk?** _____

Hvilken sluk/slukfabrikant er benyttet? _____

Er fuktinnholdet under 85% RF i betong ved montering?

☐ Ja ☐ Nei

Er sluk montert etter monteringsanvinsning fra slukleverandør?

☐ Ja ☐ Nei, beskriv:

Hvilken slukmansjett er benyttet?

☐ Membra slukmansjett universal ☐ Membra slukmansjett Joti ☐ Membra slukmansjett Serres

☐ Annen, beskriv: _____

Er slukmansjett montert iht. monteringsanvisningen?

☐ Ja ☐ Nei, beskriv: _____

Er Membra hjørnemansjetter og hjørnebånd benyttet og montert iht. monteringsanvisning?

☐ Ja ☐ Nei, beskriv: _____

Er det brukt Membra rørmansjetter?

☐ Ja ☐ Nei, beskriv: _____

Er det brukt Membra heftprimer iht. monteringsanvisning?

☐ Ja ☐ Nei, beskriv: _____

Er Membra membranduk montert iht. monteringsanvisning?

☐ Ja ☐ Nei, beskriv _____

Type veggboks: _____ **Type mansjett montert på veggboks:** _____

Foreligger det bildedokumentasjon? ☐ Minnepinne ☐ Annet Kommentar:

Kopi av material-listen er vedlagt. ☐ **Boligen er registrert i boligmappa.no** ☐


Utført og kontrollert av: _____

Firmanavn: _____

Telefon: _____ **Mailadresse:** _____


Har du husket på disse punktene? Se bildene bak.

MEMBRA®
ISOLA VÅTROMSYSTEM

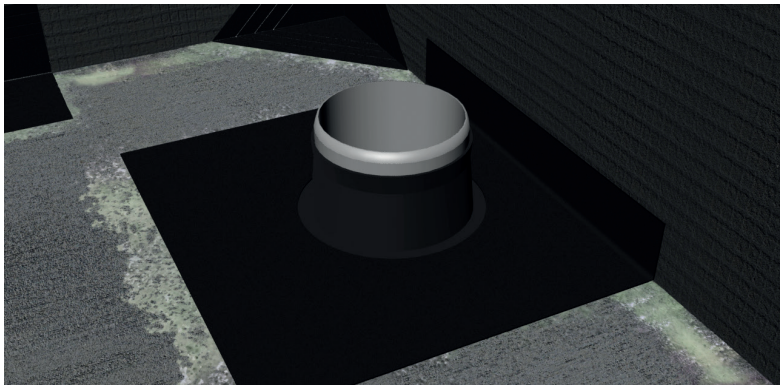


Rørmansjett gulv/vegg

Viktig å montere rørmansjett først hvis den kommer nærme vegg. Hjørnebånd over.

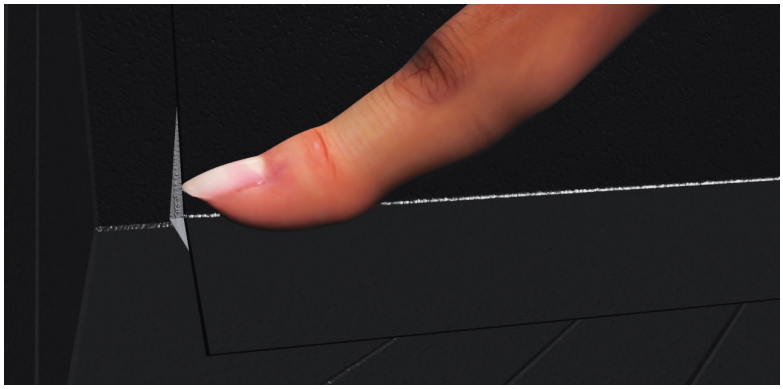


Press ut klebestoff

Hjørnebånd 1 cm fra hjørne, press hardt slik at du ser det tyter ut butyl mellom hjørnebånd og hjørnemansjett.

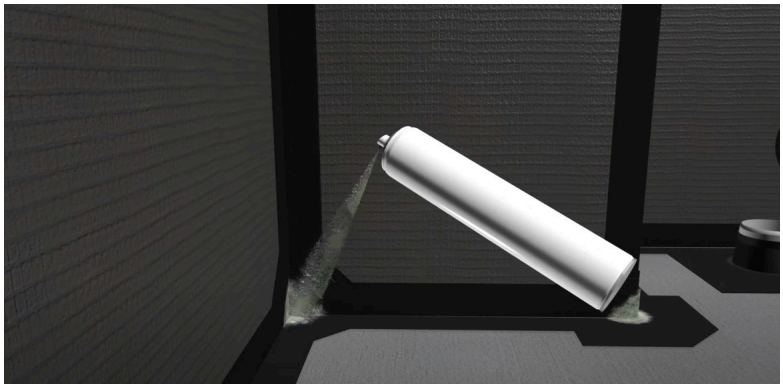

Hefteprimer i alle hjørner

Spray ekstra i hjørnene slik at overgang mellom hjørnebånd og hjørnemansjett er godt dekket.

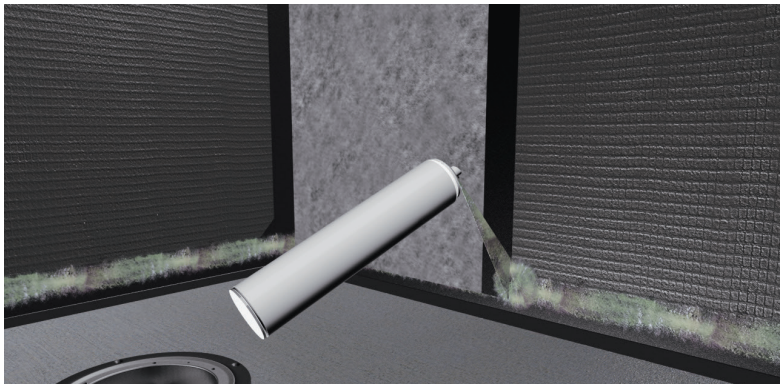

Hefteprimer på omleggskant

Spray overgangen mellom veggduk og hjørnebånd.
